

HƯỚNG DẪN NHANH

DÀNH CHO TRƯỞNG/PHÓ PHÒNG BAN

Biến mục tiêu thành công việc - biến dữ liệu thành hành động

- 1

NHẬN MỤC TIÊU
- 2

PHÂN RÃ VIỆC
- 3

GIAO NGƯỜI - GIAO HẠN
- 4

CẬP NHẬT TUẦN
- 5

KIỂM SOÁT NGÂN SÁCH

TRƯỞNG VÀ PHÓ PHÒNG DÙNG CHUNG MỘT CÁCH VẬN HÀNH

Tài liệu tập trung vào những thao tác đang có trên WebApp: xem Dashboard, nhận mục tiêu Master, phân rã công việc chi tiết, giao đầu mối, cập nhật kết quả tuần và kiểm soát ngân sách gắn công việc.

NHÌN ĐÚNG

Đúng dự án, đúng phòng/ban, đúng kỳ dữ liệu.

GIAO RÕ

Một đầu mối, một đầu ra, một thời hạn kiểm soát.


CHỐT SỚM

Cập nhật rủi ro và ngân sách ngay trong nhịp tuần.

1. VAI TRÒ VÀ NHỊP ĐIỀU HÀNH

KHÔNG CHỈ XEM - PHẢI BIẾN MỤC TIÊU THÀNH KẾT QUẢ

Trưởng/Phó phòng là “chủ sở hữu vận hành” của mục tiêu được giao. Một mục tiêu chỉ được coi là đã triển khai khi đã có công việc chi tiết, người chịu trách nhiệm, đầu ra, hạn hoàn thành, phụ thuộc và cách cập nhật kết quả.



04 nguyên tắc không được phá

1 Master là nguồn chuẩn

Không tự sửa ngày kế hoạch gốc, tiến nhiệm hoặc tạo mã Master mới tùy ý.

2 Việc chi tiết phải truy được về mục tiêu

Mỗi việc chi tiết phải liên kết đúng Master và đúng phòng/ban.

3 Cập nhật theo tuần, không chờ cuối tháng

Kết quả, % hoàn thành, vướng mắc và giải pháp phải được ghi nhận đúng kỳ.

4 Ngân sách đi cùng công việc

Theo dõi trần được giao, chi tuần, lũy kế và còn lại ngay tại nhịp báo cáo.

PHẠM VI HIỆN TẠI

Tài liệu hướng dẫn ngân sách gắn công việc và Dashboard ngân sách phòng/ban. Module lập ngân sách trực tiếp cho mục tiêu Master chưa hoàn thiện, vì vậy chưa đưa thành thao tác bắt buộc trong phiên bản này.

2. DASHBOARD PHÒNG/BAN

MÀN HÌNH MỞ ĐẦU NGÀY LÀM VIỆC

The screenshot shows the 'Dashboard Phòng/Ban' interface. It includes a top navigation bar with tabs like 'Dashboard công việc', 'Dashboard ngân sách', 'Gantt', 'Hướng dẫn sử dụng', and 'Lập & cập nhật công việc'. The main area displays a summary of tasks with filters for 'Phòng/Ban' and 'Dự án'. Key statistics include: 182 tasks in progress, 23 completed, 27 pending, 132 on hold, 16 overdue, and 8 tasks due in 14 days. Below these are two tables: 'Top 5 quá hạn' (Top 5 overdue) and 'Đến hạn trong 14 ngày tới' (Due in 14 days). A 'Kết quả tháng này' (This month's results) table is also present. A sidebar on the right contains a 'Trưởng/Phó dùng để' (For use by Head/Deputy) section with a checklist.

1. Chuyển chế độ xem: Switch between view modes.

2. Bộ lọc Phòng/Ban & Dự án: Filter tasks by department and project.

3. KPI khởi lượng công việc: Key Performance Indicator for task volume.

4. Top 5 quá hạn: List of the top 5 overdue tasks.

5. Đến hạn trong 14 ngày: List of tasks due within the next 14 days.

6. Kết quả tháng này: Summary of results for the current month.

7. Mốc chính liên quan: Key milestones related to the tasks.

Trưởng/Phó dùng để: Checklist for the Head/Deputy to use.

- ✓ Rà việc của đơn vị
- ✓ Giao và điều phối nguồn lực
- ✓ Nhận diện việc cần tháo gỡ

1. Chọn phạm vi

Chọn đúng phòng/ban và dự án. Bấm Refresh sau khi dữ liệu thay đổi.

2. Đọc tín hiệu đỏ

Ưu tiên Quá hạn, Đến hạn 14 ngày và Mốc chính liên quan.

3. Mở việc cần xử lý


Bấm dòng việc để kiểm tra người chủ trì, thời hạn và nguyên nhân.

CÂU HỎI QUẢN LÝ

Việc nào đang chậm? Ai chịu trách nhiệm chính? Đầu vào nào đang thiếu? Cần tháo gỡ trong hôm nay hay trong tuần?

3. DASHBOARD DỰ ÁN

ĐẶT CÔNG VIỆC CỦA ĐƠN VỊ TRONG BỨC TRANH CHUNG

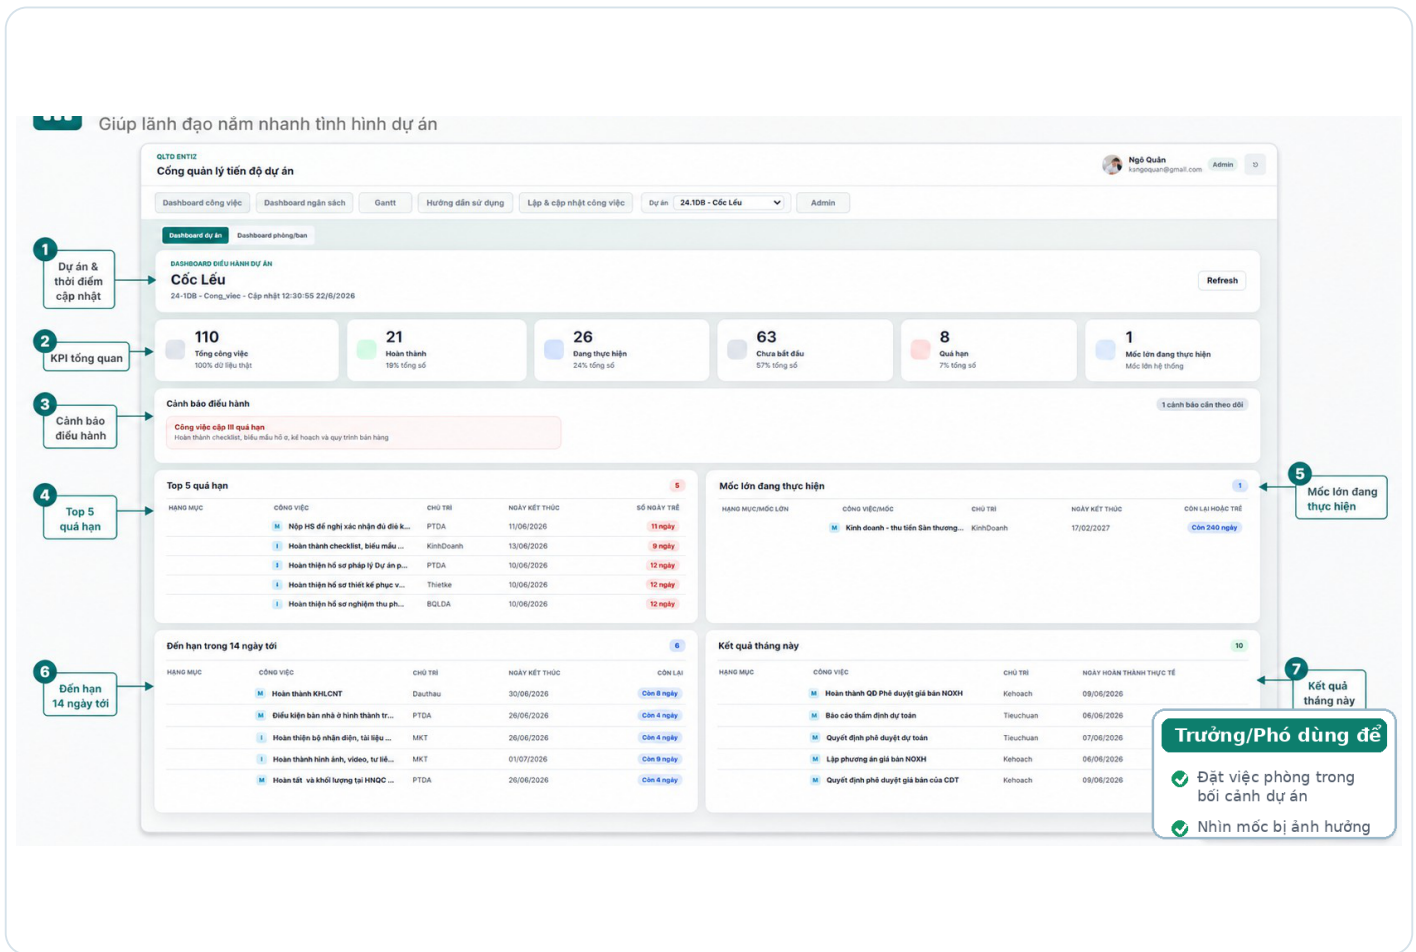

NHÌN MỐC

Mục tiêu của phòng đang đóng góp vào mốc lớn nào?

NHÌN CHUỖI

Một việc chậm có kéo theo đơn vị khác không?

NHÌN ƯU TIÊN


Việc nào cần xử lý trước để bảo vệ mốc dự án?

ĐỌC ĐÚNG DỮ LIỆU

Tỷ lệ hoàn thành thấp là tín hiệu cần kiểm tra, không phải kết luận ngay về năng lực. Phải xem thêm phụ thuộc, đầu vào, thời điểm cập nhật và phạm vi chịu trách nhiệm.

4. GANTT ĐIỀU HÀNH

KIỂM TRA CHUỖI ẢNH HƯỞNG TRƯỚC KHI CAM KẾT

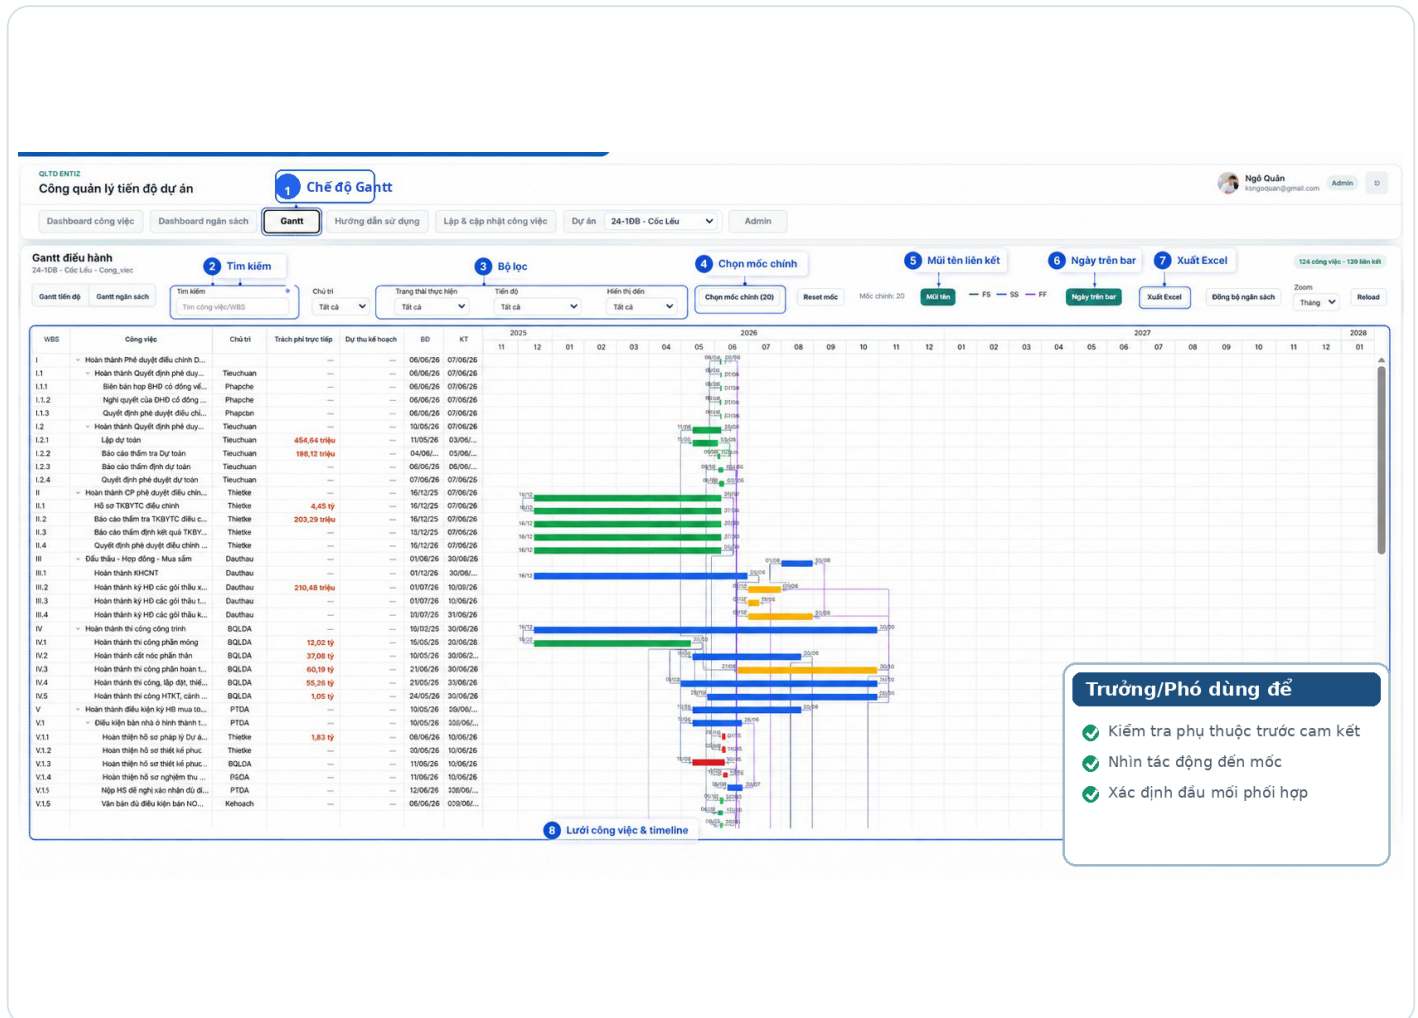

LỘC ĐÚNG

Chọn phòng/ban, trạng thái và cấp hiển thị; dùng Tháng/Quý cho tổng thể.

BẬT LIÊN KẾT

Bật Mũi tên để xem FS, SS, FF và công việc phía sau bị ảnh hưởng.

ĐỔI CHIẾU NGÂN SÁCH

Đọc Trần chi trực tiếp/Dự thu kế hoạch cùng thời gian, không nhập trực tiếp tại Gantt.

GANTT PHẢI TRẢ LỜI ĐƯỢC

Việc nào đang chặn mốc? Chậm bao nhiêu ngày? Công việc nào bị kéo theo? Ai cần phối hợp trước khi chốt lại cam kết?

5. NHẬN MỤC TIÊU VÀ PHÂN RÃ CÔNG VIỆC

TỪ MỤC TIÊU MASTER ĐẾN KẾ HOẠCH PHÒNG/BAN

1

MỤC TIÊU MASTER

Mã, WBS, mốc, ngày kế hoạch

2

CHỌN PHÒNG/BAN

Đúng đơn vị chịu trách nhiệm

3

THÊM VIỆC CHI TIẾT

Đầu ra có thể kiểm tra

4

GIAO NGƯỜI - GIAO HẠN

Chủ trì, phối hợp, thời gian

5

CẬP NHẬT VỀ MASTER

Trạng thái, ngày thực tế, kết quả

THAO TÁC TRÊN WEBAPP

01

Mở “Lập & cập nhật công việc”

Chọn đúng dự án và phòng/ban.

02

Chọn Mục tiêu/Công việc gốc

Đối chiếu WBS, thời gian kế hoạch và trạng thái.

03

Bấm “+ Thêm việc chi tiết”

Hệ thống giữ liên kết với mục tiêu Master.

04

Nhập đủ trường bắt buộc

Nội dung, bắt đầu, kết thúc, chủ trì, phối hợp, phụ thuộc, ghi chú.

05

Chọn “Có ngân sách kế hoạch” khi cần

Chỉ áp dụng với việc có kế hoạch ngân sách gắn công việc.

06

Bấm “Tạo việc chi tiết”

Kiểm tra lại danh sách việc dưới mục tiêu sau khi lưu.

06 trường bắt buộc để một việc chi tiết có thể giao được

1

Liên kết mục tiêu

Đúng mã Master/mục tiêu cha.

2

Đầu ra

Sản phẩm hoặc kết quả kiểm tra được.

3

Người phụ trách

Một đầu mối chính, phối hợp ghi riêng.

4

Thời hạn

Bắt đầu/kết thúc phù hợp mốc chung.

5

Phụ thuộc

Đầu vào, đơn vị cung cấp, thời điểm cần.

6

Ngân sách/rủ ro

Gắn ngân sách khi có; nêu rủi ro và xử lý.

GATE TRƯỚC KHI GIAO VIỆC

Chỉ tạo/giao việc khi đã rõ đầu ra, người phụ trách, thời hạn, phụ thuộc và mối liên hệ với mục tiêu. Dòng chưa đủ dữ liệu phải để NHẬP hoặc trả lại bổ sung.

6. GIAO VIỆC VÀ KIỂM SOÁT KẾ HOẠCH CHI TIẾT

RÕ NGƯỜI - RÕ VIỆC - RÕ HẠN - RÕ PHỤ THUỘC

TRƯỞNG/PHÓ PHÒNG	NGƯỜI CHỦ TRÌ	NGƯỜI PHỐI HỢP
✓ Chọn mục tiêu cần triển khai ✓ Phê duyệt cách phân rã ✓ Giao chủ trì và điều phối nguồn lực ✓ Kiểm tra chất lượng báo cáo	✓ Cam kết đầu ra và thời hạn ✓ Cập nhật kết quả theo tuần ✓ Nêu vướng mắc và giải pháp ✓ Chịu trách nhiệm dữ liệu	✓ Cung cấp đầu vào đúng hạn ✓ Cập nhật phần việc được giao ✓ Báo sớm nguy cơ chậm ✓ Không thay vai trò chủ trì

Checklist trước khi bấm “Tạo việc chi tiết”

Kiểm tra	Điều kiện đạt	Rủi ro nếu thiếu
Mục tiêu liên kết	Đúng WBS/Master và đúng phòng/ban	Sai chuỗi tổng hợp, sai người chịu trách nhiệm
Nội dung công việc	Cụ thể, có động từ và đầu ra	Không đo được hoàn thành
Thời gian	Nằm trong hoặc có căn cứ khác mục tiêu	Phá mốc chung hoặc tạo cam kết ảo
Chủ trì/phối hợp	Một chủ trì; phối hợp đúng vai	Không rõ đầu mối, đùn đẩy
Phụ thuộc	Nêu đầu vào và thời điểm cần	Báo chậm khi đã quá muộn
Ngân sách	Đánh dấu khi có kế hoạch ngân sách gắn việc	Không theo dõi được trần và chi theo tuần

KHÔNG ĐƯỢC LÀM

Không sửa ngày kế hoạch gốc, không sửa tiền nhiệm, không đổi phạm vi mục tiêu và không tạo mã Master mới từ kế hoạch chi tiết. Khi cần thay đổi, lập yêu cầu điều chỉnh để PMO/cấp có thẩm quyền xử lý.

7. CẬP NHẬT KẾT QUẢ TUẦN

MỘT LẦN CẬP NHẬT - BA LỚP THÔNG TIN

KẾ HOẠCH PHÒNG/BAN

CẬP NHẬT TUẦN

BÁO CẬP NHẬT

CẬP NHẬT KẾT QUẢ TUẦN

Cố Lều - BQLDA Cốc Lều

Tuần

22/05/2026 - 28/06/2026

Thứ Hai - Chủ nhật

Tuần hiện tại

Tuần sau

DANH SÁCH CÔNG VIỆC

6 công việc

Tìm WBS, tên hoặc mã...

Tất cả

Quá hạn chưa hoàn thành

MASTER

V1.3 - Hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu phần móng

BK KH: 10/05/2026 - KT KH: 10/06/2026

Chu vi: BQLDA

0%

Đang làm

Cập nhật

Đang thực hiện

MASTER

IV.2 - Hoàn thành cấu trúc phần thân

BK KH: 10/05/2026 - KT KH: 20/06/2026

Chu vi: BQLDA

0%

Đang làm

Cập nhật

MASTER

IV - Hoàn thành thi công móng

BK KH: 16/12/2025 - KT KH: 30/10/2026

Chu vi: BQLDA

0%

Đang làm

Cập nhật

MASTER

IV.4 - Hoàn thành thi công, lắp đặt, thiết bị MEP

BK KH: 01/05/2026 - KT KH: 30/10/2026

Chu vi: BQLDA

0%

Đang làm

Cập nhật

IV.2 - Hoàn thành cấu trúc phần thân

MASTER - BK: 10/05/2026 - KT: 20/06/2026

THÔNG TIN CÔNG VIỆC

LoạiMASTER

Chủ trìBQLDA

Kế hoạch11/05/2026 - 20/06/2026

Trạng thái hiện tạiĐang làm - 0%

Ngân sách gần công việc37082.432.112 đ

Nếu để xuất 100%, trạng thái Hoàn thành hoặc có ngày hoàn thành thực tế, hệ thống chỉ gửi Admin duyệt. Không tự cập nhật Công việc hoặc cột W.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRONG TUẦN

Kết quả thực hiện trong tuần

Nếu kết quả đã hoàn thành, sản phẩm đầu ra, mốc đã chốt...

TÌNH TRẠNG CÔNG VIỆC

Mức hoàn thành đến hết tuần (%)0

Trạng thái công việcĐang làm

Đã bắt đầu từ 11/05/2026

Sửa ngày

Ngày hoàn thành thực tế chưa mở

Chỉ xuất hiện khi đến dự đạt 100% hoặc trạng thái là Hoàn thành.

VƯƠNG MẮC VÀ XỬ LÝ

Vướng mắc/thứ ra

Nếu vướng mắc, nguyên nhân, tác động nếu có...

Giải pháp/đề xuất

Nếu vướng xử lý, người/phòng cần phối hợp, đề xuất quyết định...

Số	Thao tác	Yêu cầu
1	Chọn tuần và công việc	Chọn đúng kỳ báo cáo, đúng Master/việc chi tiết cần cập nhật.
2	Kết quả thực hiện	Ghi sản phẩm đầu ra, mốc đã chốt hoặc phần chưa đạt trong tuần.
3	Tình trạng công việc	Cập nhật % đến hết tuần, trạng thái và ngày thực tế khi phát sinh.
4	Vướng mắc và xử lý	Nêu nguyên nhân, tác động, đầu mối phối hợp và giải pháp/đề xuất.
5	Ngân sách gần công việc	Đọc trần được giao, chi tuần, lũy kế, còn lại; ghi chú chi theo đúng khoản.
6	Lưu báo cáo tuần	Kiểm tra dữ liệu trước khi lưu; không dùng báo cáo tuần để tự sửa Master.

Lưu ý: Nếu để xuất hoàn thành 100%, trạng thái/ngày hoàn thành phải qua luồng xác nhận theo WebApp. Khi thực tế lệch kế hoạch, chọn Có/Không điều chỉnh công việc liên quan theo nguyên tắc đã thống nhất.


QLTD ENTIZ | Phiên bản 2.1 - 22/06/2026

Trang 8

8. DASHBOARD NGÂN SÁCH PHÒNG/BAN

THEO DÕI THU, CHI, CÂN ĐỐI VÀ CẢNH BÁO

Giúp lãnh đạo theo dõi cân đối và rủi ro ngân sách

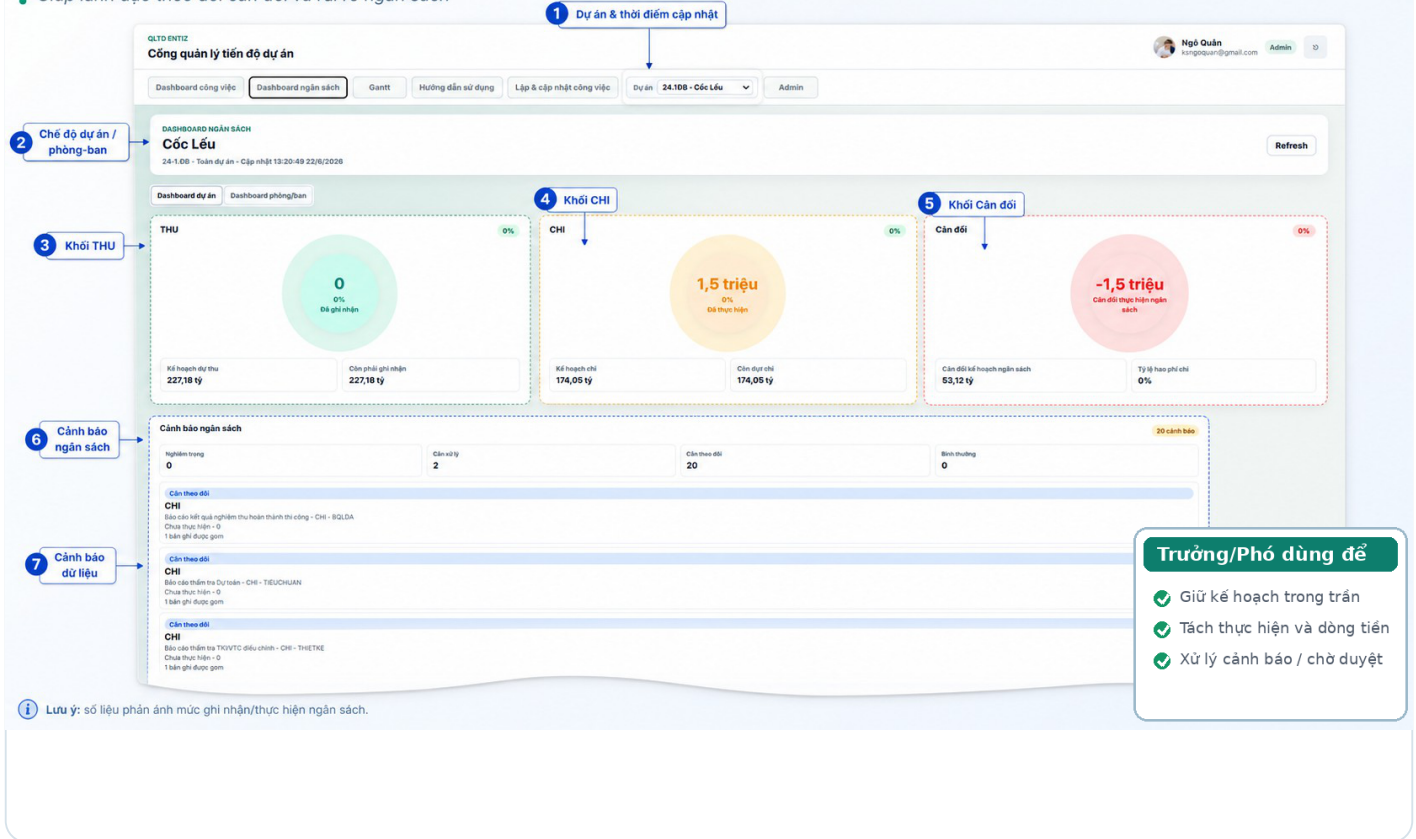

Số	Khu vực	Cách đọc
1	Dự án và thời điểm cập nhật	Xác nhận đúng phạm vi và mức độ mới của dữ liệu.
2	Chế độ dự án/phòng-ban	Chuyển sang góc nhìn phòng/ban để kiểm soát đơn vị.
3	Khối THU	Đọc kế hoạch dự thu, mức ghi nhận và phần còn phải ghi nhận.
4	Khối CHI	Đọc kế hoạch chi, mức thực hiện/ghi nhận và phần còn được chi.
5	Khối Cân đối	Theo dõi chênh lệch THU - CHI theo dữ liệu đang ghi nhận.
6	Cảnh báo ngân sách	Ưu tiên Nghiêm trọng, Cần xử lý và Cần theo dõi.
7	Cảnh báo dữ liệu	Khoản/giao dịch chưa xác nhận không dùng làm KPI chính thức.

9. ĐỌC NGÂN SÁCH ĐÚNG

TRÁNH NHẦM KẾ HOẠCH, THỰC HIỆN VÀ DÒNG TIỀN

TRẦN ĐƯỢC GIAO Hạn mức tối đa đã được giao; phòng/ban không tự tăng.	KẾ HOẠCH THÁNG/TUẦN Giá trị dự kiến theo kỳ; tuần là chi tiết của tháng.
GIÁ TRỊ THỰC HIỆN Khối lượng/nghĩa vụ đã được ghi nhận hoặc xác nhận.	THỰC THU/THỰC CHI Dòng tiền thực tế vào/ra; không suy diễn từ kế hoạch.

06 bước kiểm soát ngân sách của phòng/ban

1 Kiểm tra đúng dự án/phòng/kỳ Không đọc số liệu khi bộ lọc hoặc thời điểm cập nhật chưa đúng.	2 Tách THU và CHI Mỗi khoản phải có hướng THU hoặc CHI; không suy từ tên khoản.
3 Đọc cảnh báo dữ liệu trước Khoản chưa xác nhận không dùng làm kết luận chính thức.	4 Đối chiếu với công việc Có chi nhưng việc chưa bắt đầu, hoặc việc hoàn thành nhưng chưa ghi nhận là tín hiệu bất thường.
5 Không cộng trùng tuần-tháng Kế hoạch tuần chỉ là lớp chi tiết của kế hoạch tháng.	6 Xử lý vượt trần bằng phê duyệt Không tự điều chỉnh trần trong báo cáo; phải có luồng xác nhận/điều chỉnh.

Phạm vi đã có và phần sẽ bổ sung

Đang vận hành	Sẽ hướng dẫn sau khi hoàn thiện module
Ngân sách gắn công việc trong cập nhật tuần	Lập ngân sách trực tiếp cho mục tiêu Master
Dashboard ngân sách phòng/ban	Phân bổ trần cấp mục tiêu và workflow duyệt
Gantt hiển thị Trần chi trực tiếp/ Dự thu kế hoạch	Đối chiếu tự động trần mục tiêu với tổng việc chi tiết

10. NHỊP VẬN HÀNH VÀ BẢNG TRA NHANH

MỖI NGÀY NHÌN ĐÚNG - MỖI TUẦN CHỐT ĐỦ

HẰNG NGÀY - 5 PHÚT	HẰNG TUẦN - 30 PHÚT	KHI CÓ BIẾN ĐỘNG
✓ Mở Dashboard phòng/ban ✓ Xem Quá hạn và đến hạn 14 ngày ✓ Kiểm tra cảnh báo ngân sách/dữ liệu ✓ Giao xử lý ngay việc có rủi ro	✓ Rà mục tiêu và việc chi tiết ✓ Cập nhật kết quả, % và trạng thái ✓ Nêu vướng mắc, giải pháp, phối hợp ✓ Cập nhật ngân sách gắn công việc	✓ Mở Gantt kiểm tra ảnh hưởng ✓ Chọn Có/Không điều chỉnh liên quan ✓ Gửi yêu cầu điều chỉnh khi cần ✓ Không tự sửa Master hoặc trần

Cần xử lý việc gì - mở màn hình nào?

Vấn đề	Màn hình	Tập trung
Dự án/phòng đang chậm ở đâu?	Dashboard phòng/ban	Quá hạn, đến hạn 14 ngày, mốc liên quan
Việc của đơn vị ảnh hưởng dự án thế nào?	Dashboard dự án	Cảnh báo điều hành, mốc lớn, kết quả tháng
Chậm sẽ kéo theo việc nào?	Gantt	Mũi tên liên kết, ngày trên bar, chuỗi phụ thuộc
Mục tiêu đã có kế hoạch thực hiện chưa?	Lập & cập nhật công việc	Việc chi tiết, chủ trì, thời hạn, phụ thuộc
Tuần này đạt gì và vướng gì?	Cập nhật tuần	Kết quả, %, trạng thái, vướng mắc, giải pháp
Ngân sách đơn vị có bất thường?	Dashboard ngân sách	THU, CHI, cảnh báo ngân sách và dữ liệu

THÔNG DIỆP CHỐT

QLTD không làm thay trách nhiệm quản lý. Công cụ giúp Trưởng/Phó phòng nhìn sớm hơn, giao rõ hơn, cập nhật có căn cứ hơn và giữ mục tiêu - công việc - ngân sách trong cùng một chuỗi kiểm soát.
